

Wertzeit FS „Meteor“ in Bremerhaven

Berichtszeitraum: 27.05. bis 02.06.2010

Seit der zurückliegenden Woche befinden sich die Werftarbeiten in der zweiten Halbzeit, was sich an vielen Arbeitsschwerpunkten darin widerspiegelt, dass mit den Aufbauarbeiten begonnen wurde.




Beginnende Fliesenarbeiten in der Kombüse vor Widermontage der Geräte

Teilweise können weiterhin notwendige Arbeiten entsprechend ihres Umfanges, auf Grund der noch verbleibenden Zeit, ordentlich zum Abschluss gebracht werden, die jedoch z.T. nach Fertigstellung trotz der Aufwendung, dem Betrachter nach der Werft im Verborgenen bleiben werden, wie nachstehende Bilder zeigen.



Stahlarbeiten in Luke 1 vor der Neuverlegung der Holzbeplankung

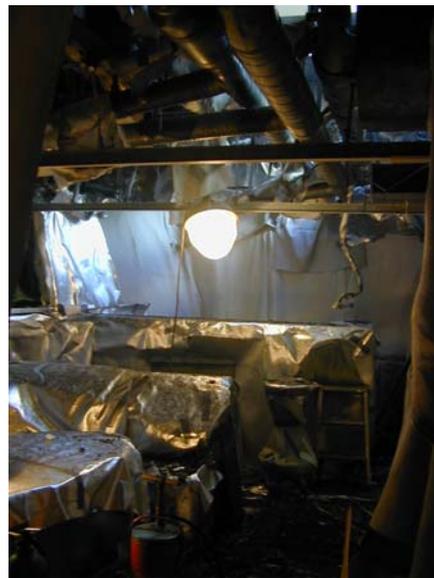

Demontage der Innenverkleidung zum vorbeugenden Brandschutz bei „Heißen Arbeiten“ in Luke 1 im darunter liegendem Besprechungsraum

Weiterhin sind nach vorbereitenden Arbeiten und der logistischen Abwicklung in den letzten beiden Wochen, grundlegende Projekte ihrem Abschluss näher gebracht worden, wie z.B. am 31.05.10 die Montage der neuen Sattelitenanlage, welches nun in den Folgetagen für viele Hände das Ziehen und Legen einiger Hundert Meter Verbindungskabel bedeutet.



Übernahme und Montage der Satteliten (Durchm.: 4m)

Mit diesen aktuellen Impressionen grüßen Besatzung, Kapitän Wunderlich und die Reederei F. Laeisz (Bremerhaven) aus den Motorenwerke Bremerhaven.
